Презентация проекта

СПРАВОЧНО — ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПО УЧЕТУ ДАННЫХ О КЛИЕНТЕ И ЕГО АВТОМОБИЛЕ НА АВТОСТОЯНКЕ

Цели проекта:

Nº	Цель	Итоговые результаты	Показател и (мес.)
1	Отказ от бумажных носителей, в пользу базы данных и приложения для взаимодействия с ней	Готовая информационная система, за счет которой будет повышена эффективность работы автостоянки с увеличение количества клиентов	100%
2	Повысить эффективность оказания услуги, за счет снижения времени сбора информации.	Занесение нового клиента занимает 2 минуты.	Экономия 13 ч.
3	Упростить навигацию и обработку информации.	Поиск и изменение информации о существующем клиенте в виде списка, при необходимости с сортировкой от A до Я.	Экономия 3 ч.

Задачи проекта

Изучить используемую информационную систему

Исследовать данные на актуальность

Исключить возможность дублирования данных

Провести анализ других информационных систем

Выбрать средства для реализации программного продукта

Проектирование базы данных

Создание и заполнение базы данных

Реализация приложения

Внедрение на рабочее место

Отладка и проверка правильности работы

Ознакомление работников с системой

Анализ реализуемости

Цель	Итоговые результаты
Функциональность	Реализуемо . Присутствует в некоторых аналогах. Приложение функционально
Удобное использование	Реализуемо . Присутствует в некоторых аналогах. Приложение оптимизировано для удобного использования
Безопасность	Реализуемо . Отсутствует у аналогов. Приложение безопасно, так как данные шифруются, и для доступа к ним нужно знать пароль.

Обзор аналагов

Название	Удобство использования	Стоимость программы				
Автостоянка 1	Не удобно	Высокая				
Автостоянка 2	Не удобно	Высокая				
Автостоянка 3	Не удобно	Высокая				
Собственное приложение	Удобно	Низкая				


Структура декомпозиции задач (WBS)

		Проект		
Исследование и обоснование создания системы управления	Техническое проектирование	Разроботка рабочей документации	Поэтапная разработка системы управления, с учетом требований и целей	Внедрение в организацию
Сбор и анализ данных автоматизированного объекта	Разработка окончательной структуры функциональной, организационной	Разработка технической документации	Разработка базы данных	Пуско наладочные работы
Сбор сведений об аналогичных системах управления	Разработка решений по техническому и программному обеспечению	Разработка документации по организационному обеспечению	Разработка форм приложения	Обучение персонала
Сравнительная характеристика систем управления	Разработка алгоритма внедрения		Подключение базы данных к приложению	Тестирование работы вместе с персоналом
Разработка требований к организации проекта			Тестирование, отладка работы	Приёмка
Разработка ТЗ				
Разработка предварительных решений по выбранному варианту системы управления				

Календарный план

	%					
Название задачи 🔻	70 Завершені ▼	Длительнс →	Начало ▼	Окончание 🔻	Предшественники 🕶	Названия ресурсов 🔻
4 Проект	62%	29 дней	Пн 29.04.19	Чт 06.06.19		
 Исследование и обоснование создания системы управления 	100%	7 дней	Пн 29.04.19	Вт 07.05.19		
Сбор и анализ данных автоматизированного объекта	100%	2 дней	Пн 29.04.19	Вт 30.04.19		Заказчик[50%];Разработчики[50%]
Сбор сведений об аналогичных системах управления	100%	2 дней	Cp 01.05.19	Чт 02.05.19	3	Заказчик[50%];Разработчики[50%]
Сравнительная характеристика систем управления	100%	1 день	Пт 03.05.19	Пт 03.05.19	4	Заказчик[50%];Разработчики[50%]
Разработка требований к организации проекта	100%	2 дней	Пн 06.05.19	Вт 07.05.19	5	Заказчик[50%];Разработчики[50%]
Разработка T3	100%	1 день	Cp 08.05.19	Cp 08.05.19	6	Разработчики
Разработка предварительных решений по выбранному варианту системы управления	100%	1 день	Чт 09.05.19	Чт 09.05.19	7	Разработчики
 Техническое проектирование 	100%	7 дней	Пт 10.05.19	Пн 20.05.19		
Разработка окончательной структуры функциональной, организационной	100%	3 дней	Пт 10.05.19	Вт 14.05.19	8	Разработчики
Разработка решений по техническому и программному обеспечению	100%	3 дней	Cp 15.05.19	Пт 17.05.19	10	Разработчики
Разработка алгоритма внедрения	100%	1 день	Пн 20.05.19	Пн 20.05.19	11	Разработчики
 Разроботка рабочей документации 	100%	2 дней	Вт 21.05.19	Cp 22.05.19		
Разработка технической документации	100%	1 день	Вт 21.05.19	Вт 21.05.19	12	Разработчики
Разработка документации по организационному обеспечению	100%	1 день	Cp 22.05.19	Cp 22.05.19	14	Разработчики
 Поэтапная разработка системы управления, с учетом требований и целей 	0%	6 дней	Чт 23.05.19	Чт 30.05.19		
Разработка базы данных	0%	3 дней	Чт 23.05.19	Пн 27.05.19	15	Разработчики
Разработка форм приложения	0%	1 день	Вт 28.05.19	Вт 28.05.19	17	Разработчики
Подключение базы данных к приложению	0%	1 день	Cp 29.05.19	Cp 29.05.19	18	Разработчики
Тестирование, отладка работы	0%	1 день	Чт 30.05.19	Чт 30.05.19	19	Разработчики
▲ Внедрение в организацию	0%	5 дней	Пт 31.05.19	Чт 06.06.19		
Пуско наладочные работы	0%	1 день	Пт 31.05.19	Пт 31.05.19	20	Разработчики
Обучение персонала	0%	1 день	Пн 03.06.19	Пн 03.06.19	22	Заказчик[50%];Разработчики[50%]
Тестирование работы вместе с персоналом	0%	2 дней	Вт 04.06.19	Cp 05.06.19	23	Заказчик[50%];Разработчики[50%]
Приёмка	0%	1 день	Чт 06.06.19	Чт 06.06.19	24	Заказчик[50%];Разработчики[50%]

Диаграмма Ганта

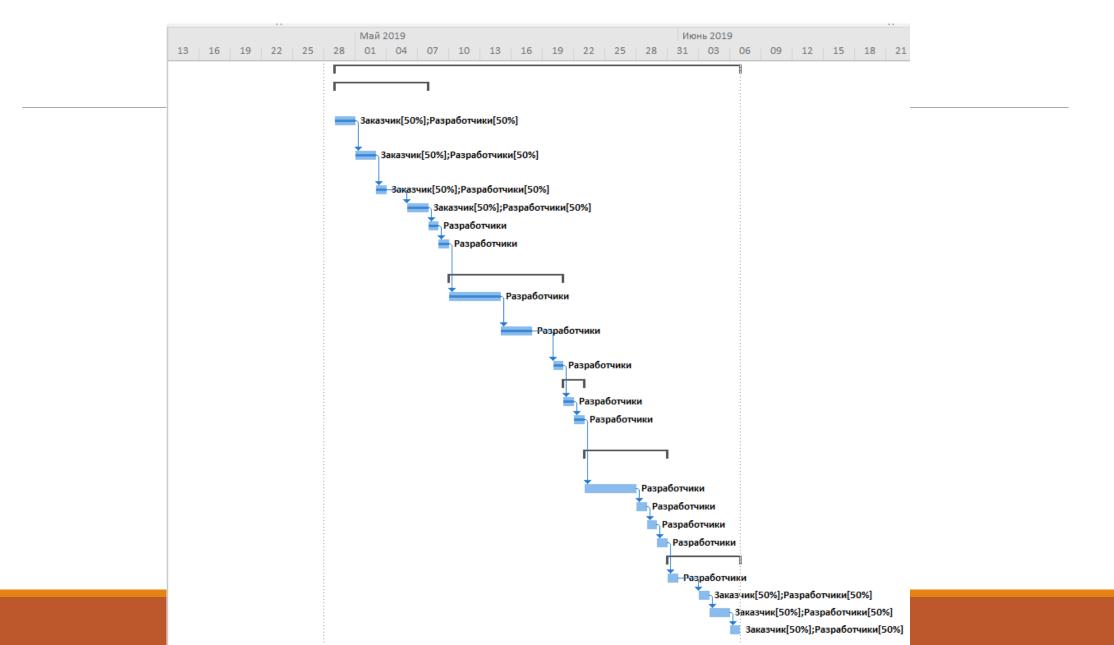

ОБЗОР ЗАТРАТ

ПН 29.04.19 - ЧТ 06.06.19

ЗАТРАТЫ

56 400,00 ₽

ОСТАВШИЕСЯ ЗАТРАТЫ

21 600,00 ₽

% ЗАВЕРШЕНИЯ

62%


СОСТОЯНИЕ ЗАТРАТ

Состояние затрат для задач верхнего уровня.

Название	Фактическ ие затраты	Оставшиеся затраты	Базовые затраты	Затраты	Отклонение по стоимости
Проект	34 800,00 ₽	21 600,00 ₽	127 680,00 ₽	56 400,00 ₽	-71 280,00 ₽

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАТРАТЫ


Ход выполнения в сравнении с затратами во времени. Превышение значения в строи "Совокупные затраты" над значением в строке "Процент завершения" указывает на возможное превышение бюджета.

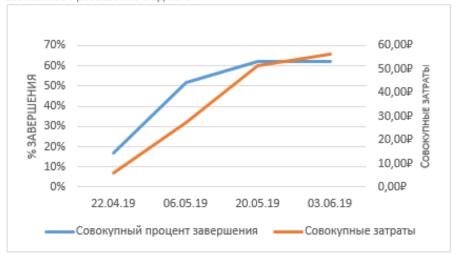

СОСТОЯНИЕ ЗАТРАТ

Состояние затрат для всех задач верхнего уровня. Равны ли ваши базовые затраты н

Попытка задания в качестве базового плана

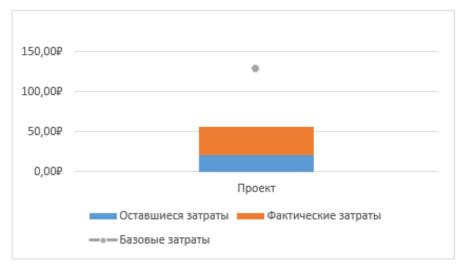





СТАТИСТИКА ТРУДОЗАТРАТ

Отображение статистики трудозатрат для всех задач верхнего уровня.

ВЫРАБОТКА ТРУДОЗАТРАТ

Отображение объема выполненных и оставшихся трудозатрат. Если линия оставшихся совокупных трудозатрат опускается вниз, выполнение проекта может запаздывать.

Являются ли ваши базовые трудозатраты нулевыми?

Попробуйте задать базовые трудозатраты

% завершения по трудозатратам

62%

Оставшиеся трудозатраты

88 4


Фактические трудозатраты


144 ч


ОБЗОР


Пн 29.04.19 - Чт 06.06.19


Бизнес – процессы объекта автоматизации

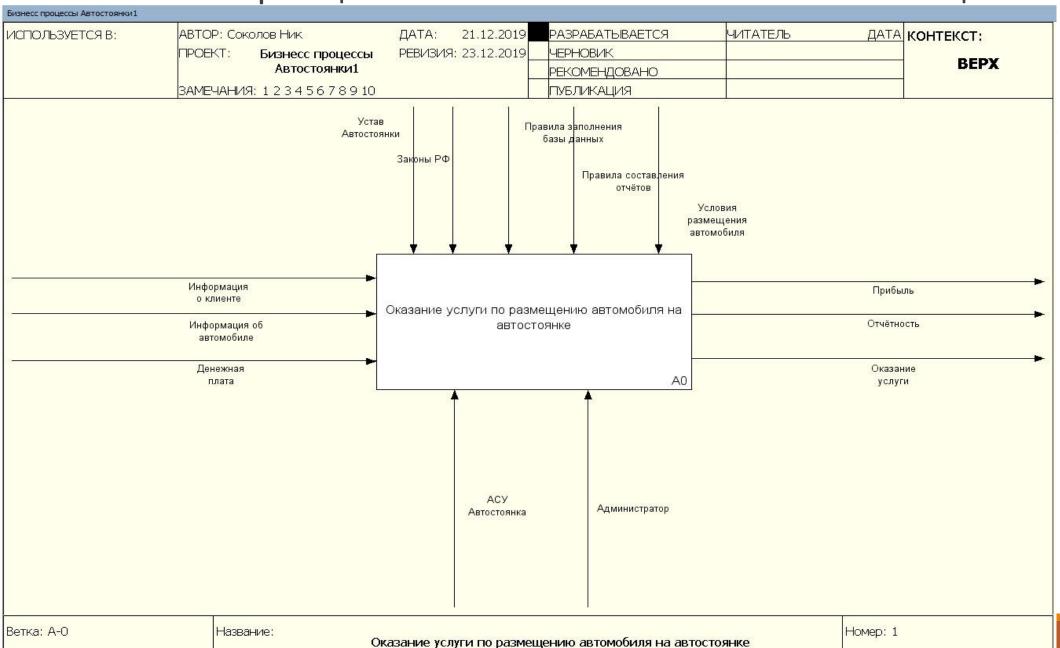

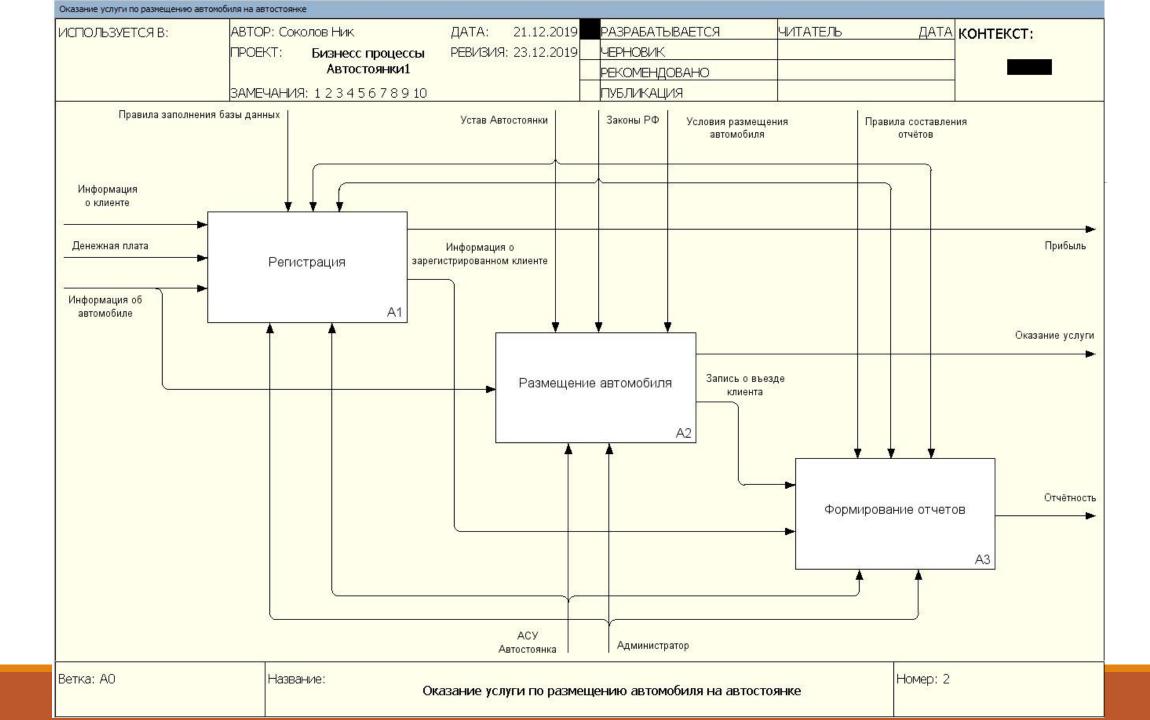


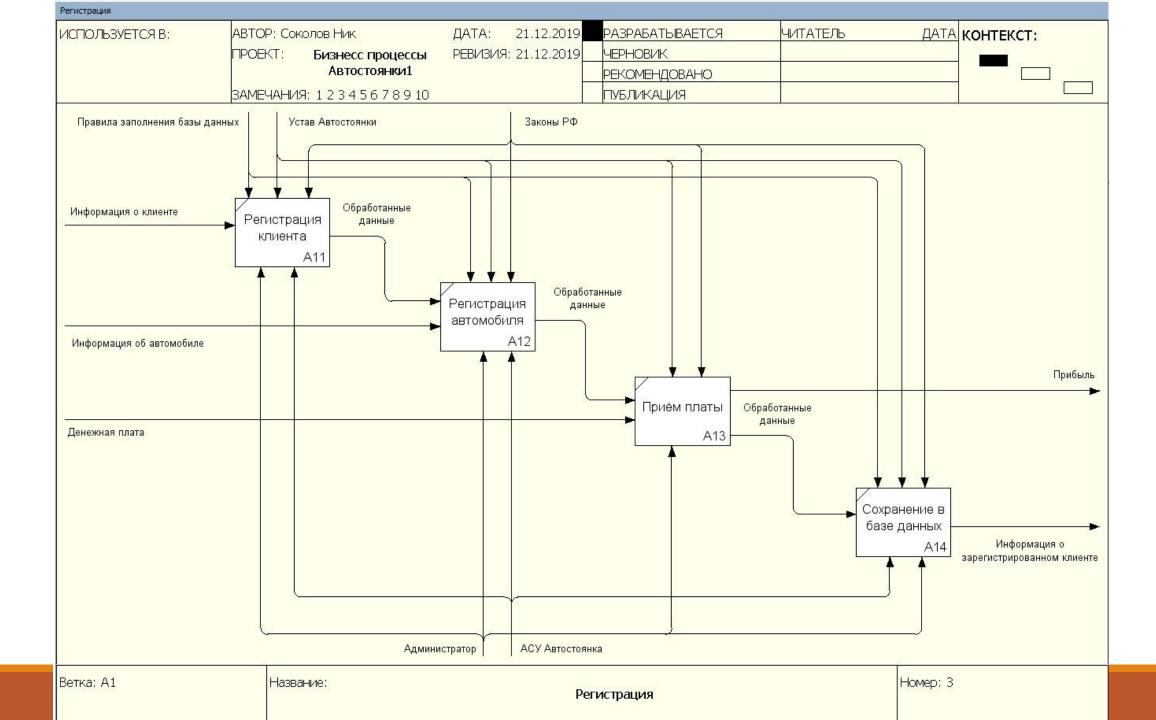


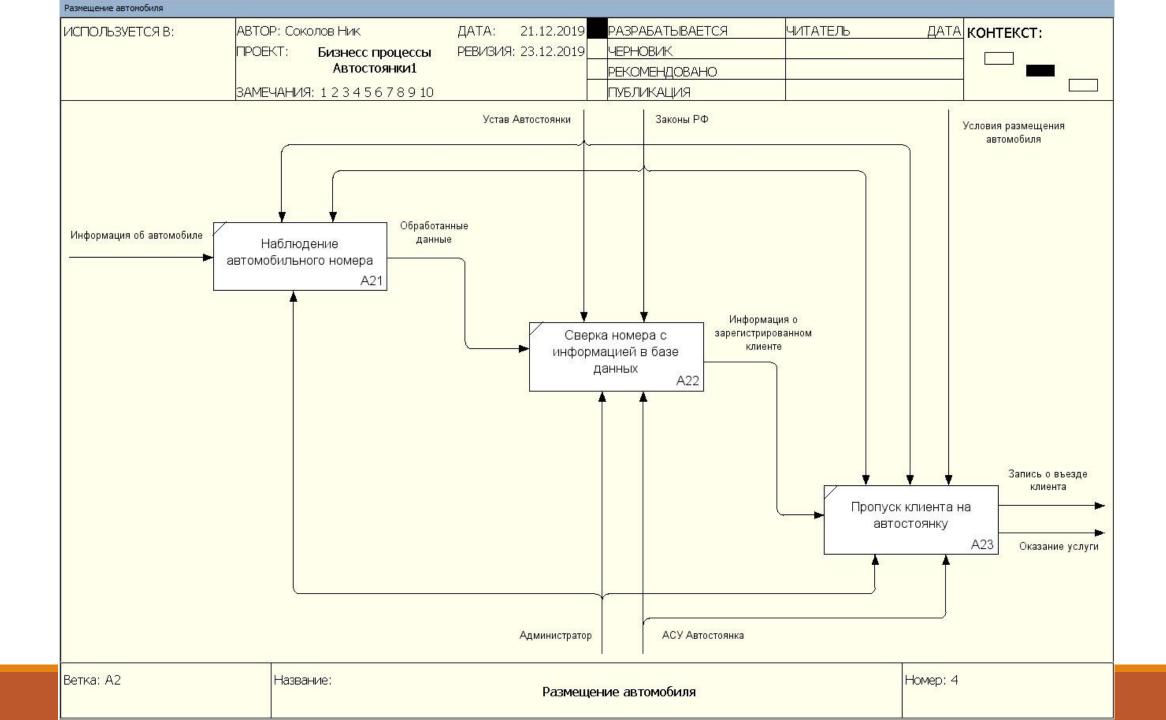


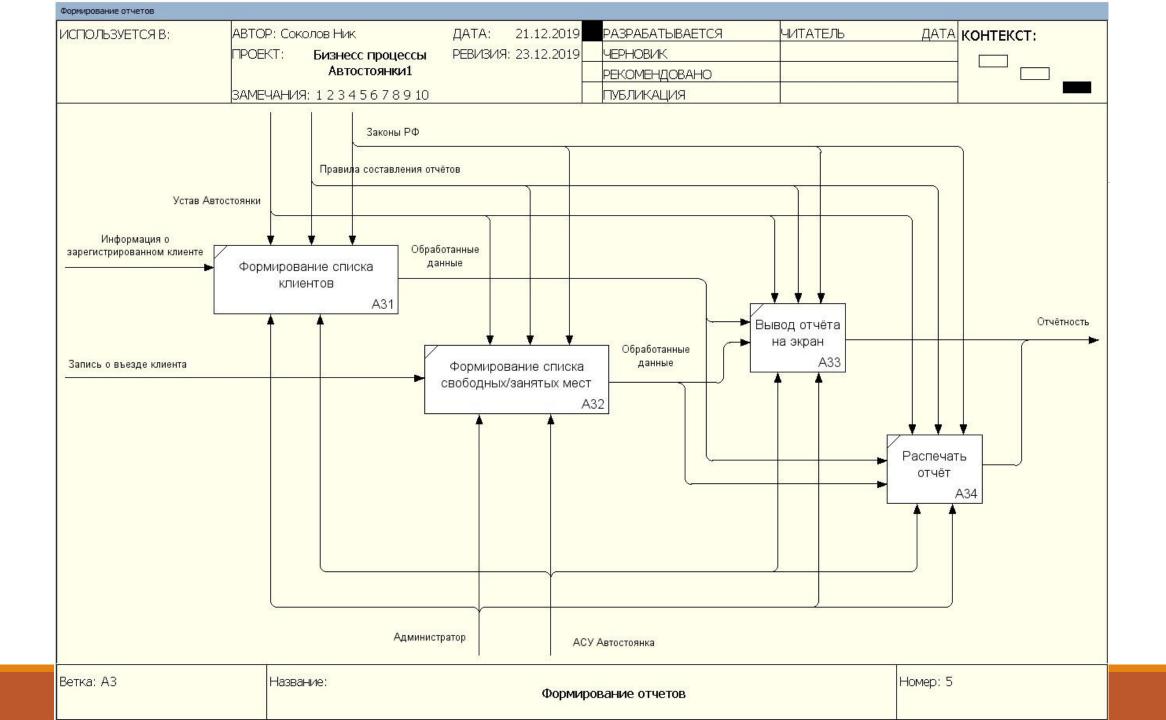


BPMN диаграммы

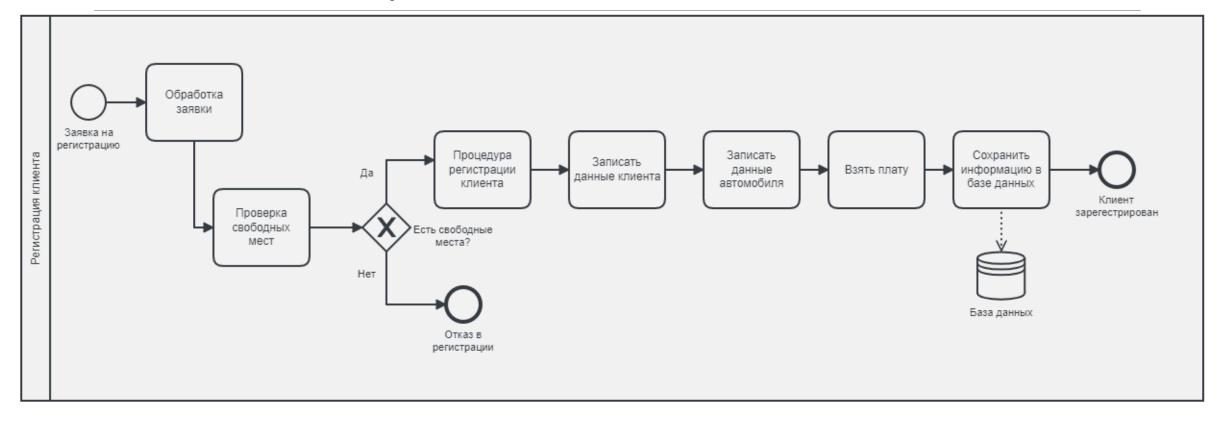

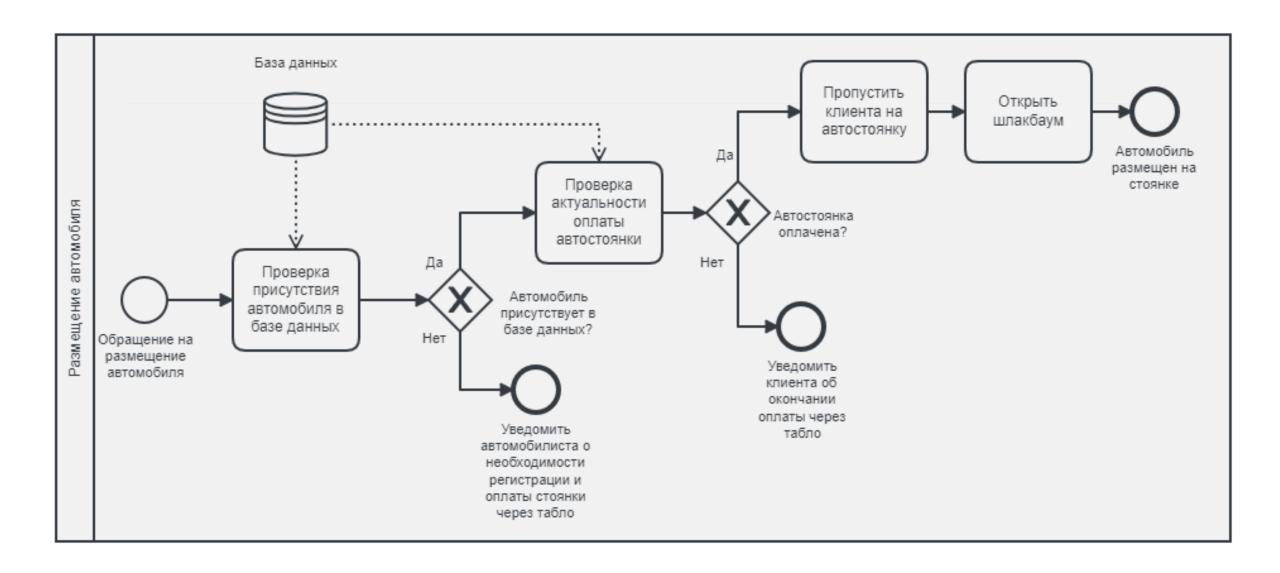


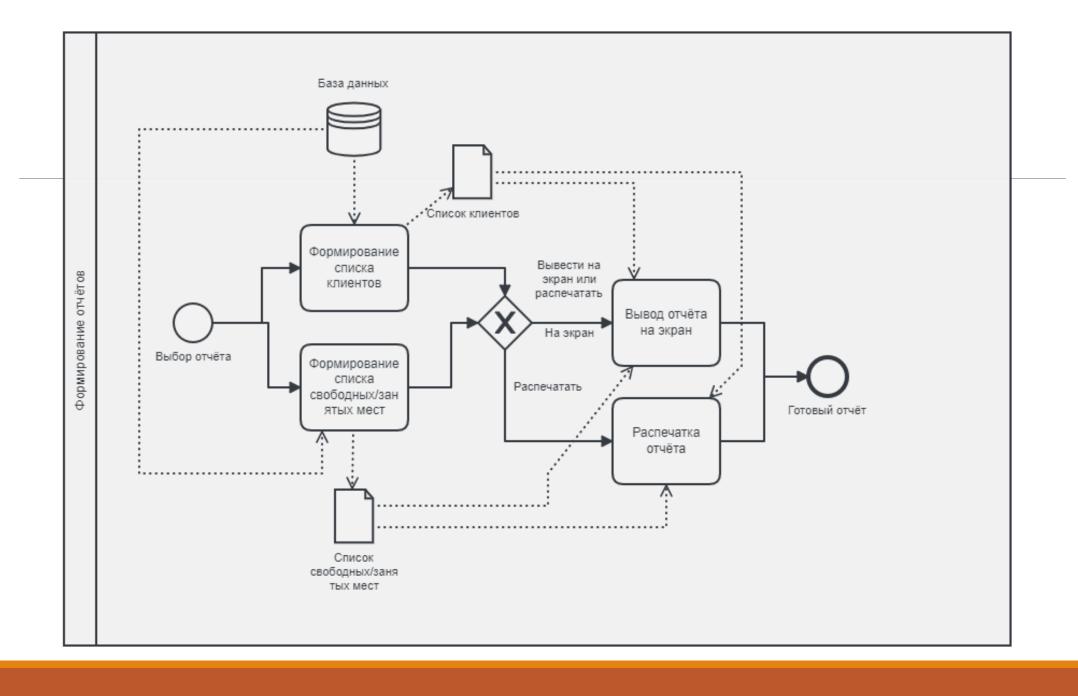

Requisite PRO I Требования

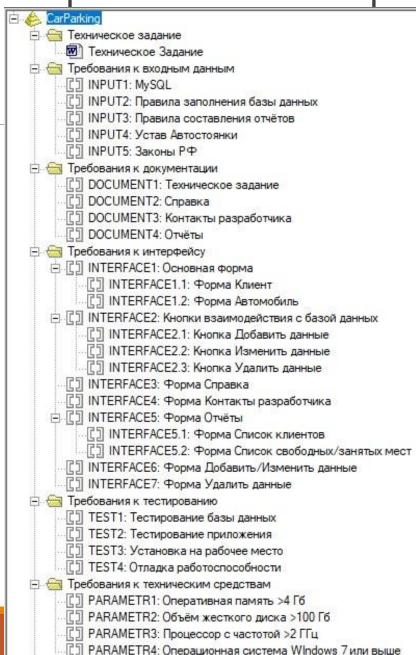


Функциональные требования Функционал I Интерфейс [] FUNC1.1: Отображение данных клиента [] FUNC2.1: Добавить данные [] FUNC2.2: Изменить данные [] FUNC2.3: Удалить данные [5] FUNC3: Вывод справки [] FUNC4: Вывод контактов разработчика ☐ ГЛ FUNC5: Вывод отчётов [] FUNC5.1: Вывод списка клиентов [] FUNC5.2: Вывод списка свободных/занятых мест [] FUNC6: Отображение формы Добавить/Изменить данные [] FUNC7: Отображение формы Удалить данные

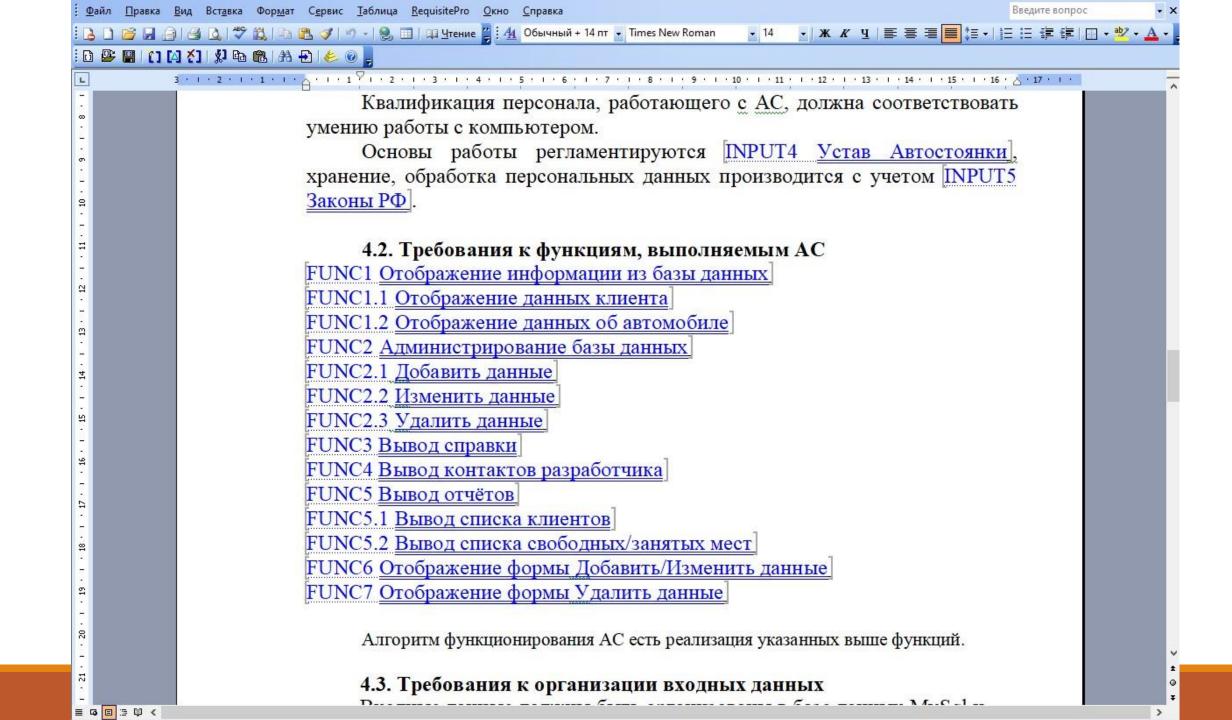


Relationships: - direct only	⊟ INTERFACE Основная форма	INTERFACE Форма Клиент	TUDINA		IVIOLINA	INTERFACE Кнопка Изменить данные	INTERFACE Кнопка Удалить данные	INTERFACE Форма Справка	TUPINA	Отчёты	Список	INTERFACE Форма Список свободных/з мест	Добавить/Из	торича
□ FUNC1: Отображение информации из базы данных Отображение информации из базы данных	≙													
FUNC1.1: Отображение данных клиента Отображение данных клиента		<u></u>												
FUNC1.2: Отображение данных об автомобиле Отображение данных об автомобиле			≙		,									
─ FUNC2: Администрирование базы данных Администрирование базы данных			770	≙										
FUNC2.1: Добавить данные Добавить данные					≙									
FUNC2.2: Изменить данные Изменить данные						ቇ								
FUNC2.3: Удалить данные Удалить данные					12		≙					,		
FUNC3: Вывод справки Вывод справки								∌						
FUNC4: Вывод контактов разработчика Вывод контактов разработчика									∌					
										∌				
FUNC5.1: Вывод списка клиентов Вывод списка клиентов					,						≙	,		
FUNC5.2: Вывод списка свободных/занятых мест Вывод списка свободных/занятых мест		9	0							0	100	♪		
FUNC6: Отображение формы Добавить/Изменить Отображение формы Добавить/Изменить данные													≙	
FUNC7: Отображение формы Удалить данные Отображение формы Удалить данные														∌


Диаграммы Rational Rose Основная Use case диаграмма

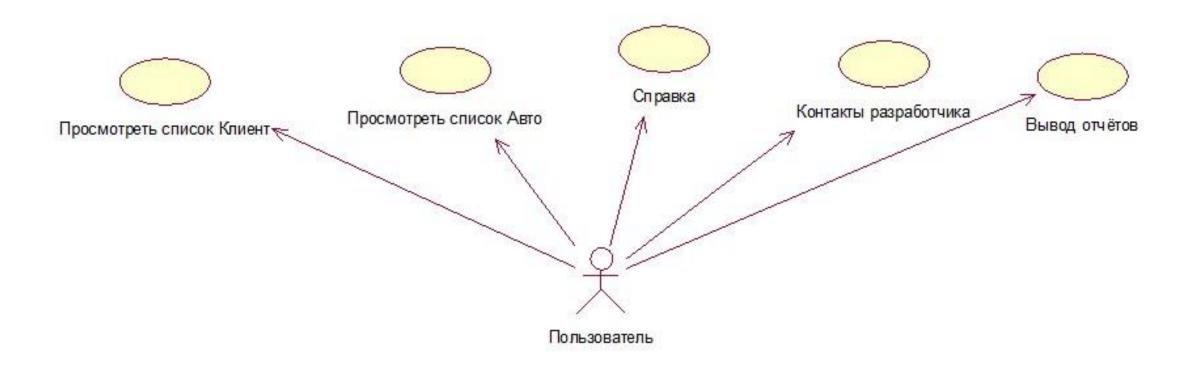


Use case – просмотреть список клиентов

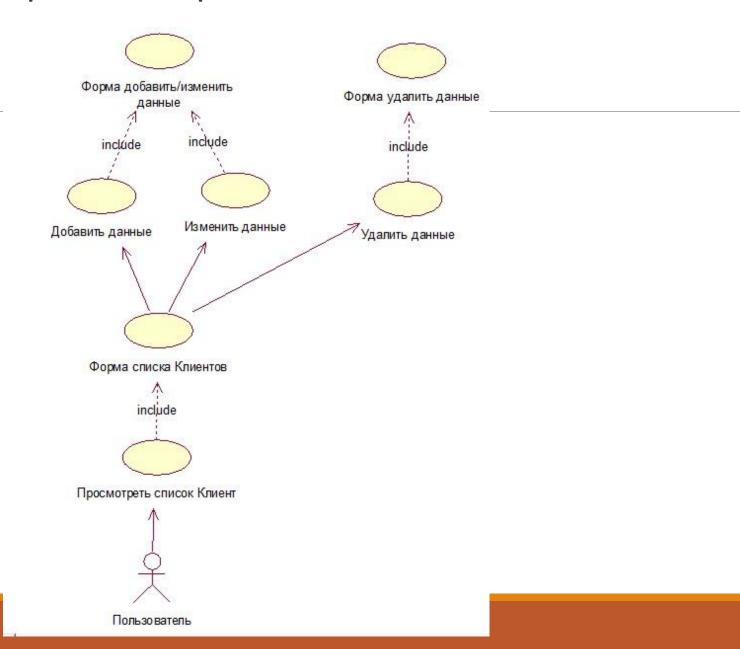

Sequence диаграмма просмотр списка авто

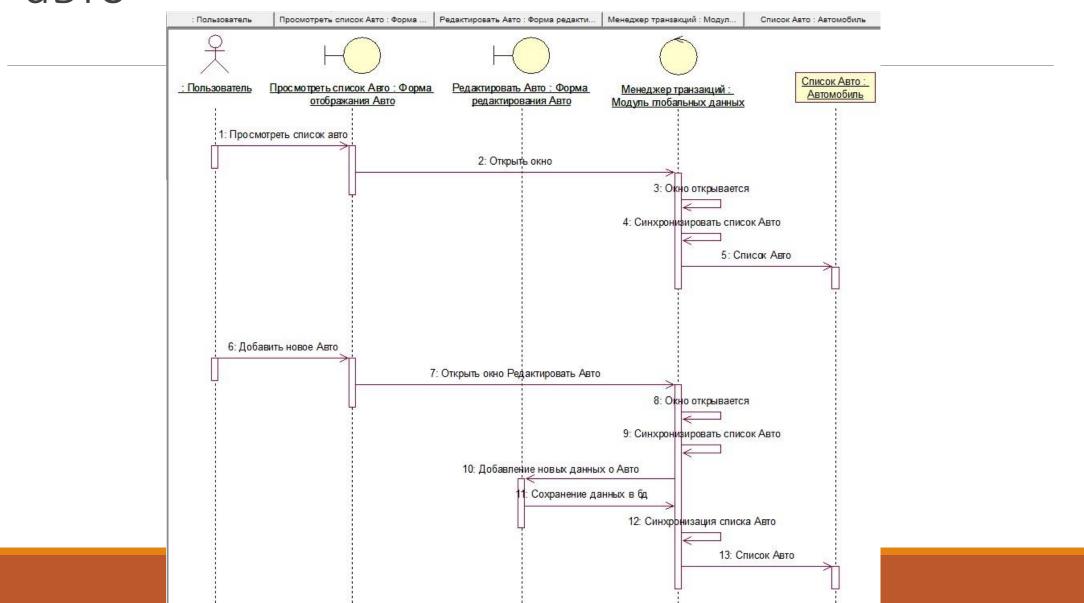

Связь Rational Rose с RequisitePro









Диаграмма клиентского приложения





Тестирование приложения

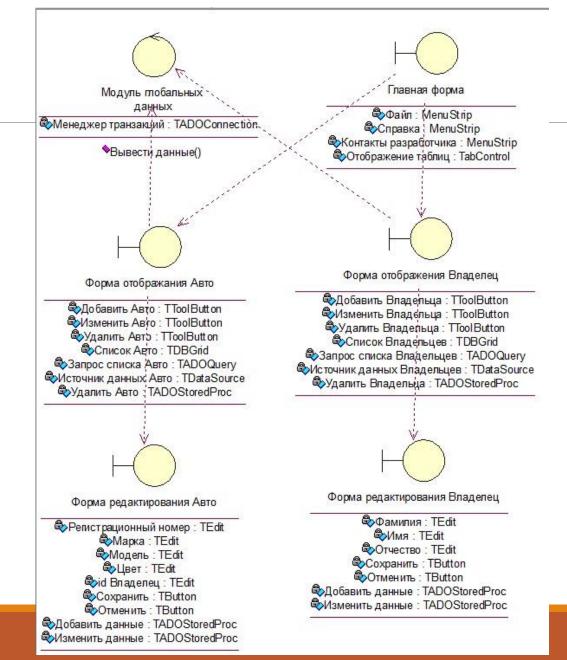


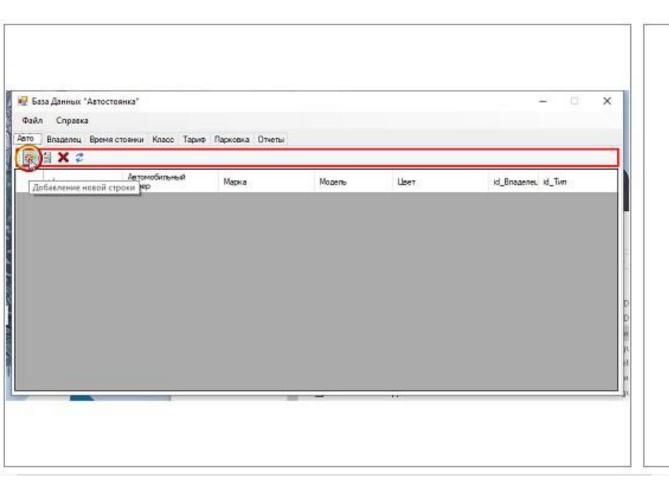


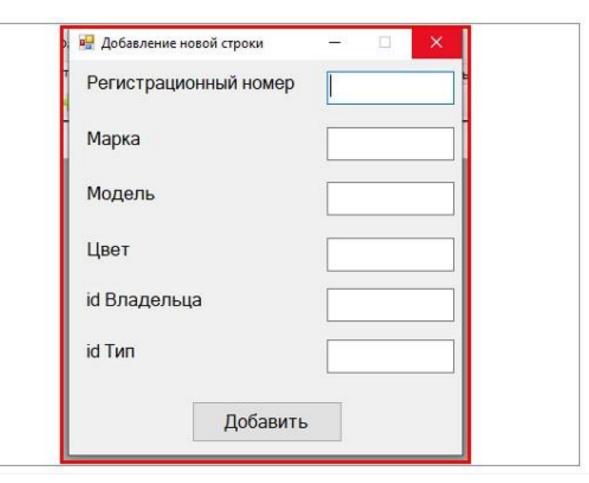


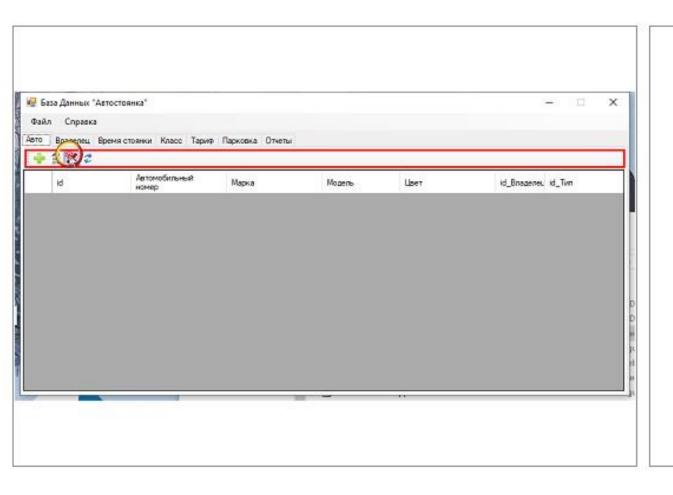


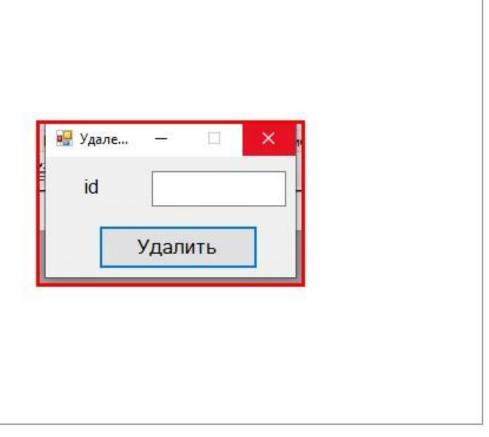


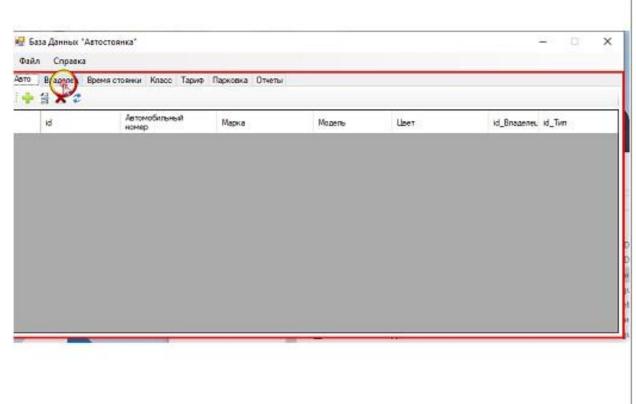

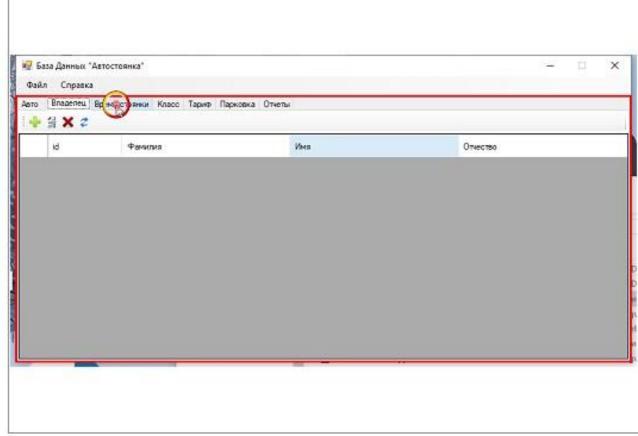







Реестр рисков проекта

Воздействие на

		CTI	Содержание Качество Расписание Стоимость							Б				
Код риска	Описание риска	Вероятност	Степень видяния.	коэффиц иент	Степень влияния	7∠ -L ⊢	Степень влияния	Весовой коэффиц иент	Степень	Весовой коэффиц иент	Величина	Стратегия реагирования на риск	Действия в рамках стратегии реагирования	Ответственный за риск
01	Риск задержки сроков из-за длительных согласований требований	0,4	-	-	-	-	1 день	-	2 400 ₽	-		Тщательное планирование этапа сбора требований, постоянный контакт с заказчиком	Эскалация на верхний уровень, фиксация промежуточных результатов, корректировка планов	Соколов Н.Р.
02	Недостаточные знания технологий, используемые для реализации проекта	0,2	-	-	-	-	5 дней	-	12 000 ₽	-		Самостоятельное изучение необходимых технологий	Выделить больше времени на анализ и изучение технологий, корректировка планов	Соколов Н.Р.
03	Длительная разработка проектной документации	0,3	-	-	-	-	4 дня	-	9 600 ₽	-		Обучение участников проектного управления	Привлечение более квалифицированных специалистов	Соколов Н.Р.
04	Риск задержки сроков из-за длительной разработки интерфейса	0,1	-	-	-	-	2 дня	-	4 800 ₽	-		Тщательное планирование этапа разработки пользовательского интерфейса, привлечение функциональных и ИТ-подразделений, постоянный контакт с	Фиксация промежуточных результатов, корректировка планов	Соколов Н.Р.

заказчиком
